

석면 해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

[도곡중앙초 등 2교(화순고) 석면철거공사]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자)		사업자등록번호				
	전라남도교육감						
	주소						
	전라남도 무안군 삼향면 남악리 1457		(061-260-0114)				
석면해체·제거 사업장	건물명	위치					
	도곡중앙초등학교, 화순고등학교	전라남도 화순군 도곡면 고인돌1로 115					
		전라남도 화순군 화순읍 진각로 31-9					
	연면적(㎡)	작업기간					
1,404.30㎡, 8,962.36㎡	2022. 07. 25. ~ 2022. 08. 29.						
	석면건축자재 [길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]						
	천장재 [텍스 996.25㎡]						
측정기관	대표자	사업자등록번호					
	그린환경연구소(주) (박한재)	620-81-58149					
	주소						
	광주광역시 북구 첨단과기로208번길 43-22 와이어스파크 B동 1707호						
	측정자/분석자						
	고두형/최유리, 조화정, 김은숙						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별첨1 참고						

측정 지점 위치(도식도)-별첨2 참고

석면 해체·제거 석면비산정도 측정 작업일보-별첨3 참고

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022 년 07 월 일


전라남도 화순군수

제출인

전라남도교육감

(서명 또는 인)

귀하



첨부서류	『산업안전보건법 시행규칙』 별지 제77호 서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	---	-----------

[별첨1]. 측정결과

측정 결과	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	#1	부지경계선	에어샘플러 (11EA)	9.90	07월 31일 (08:05~ 12:22)	검출한계 0.002f/cc미만	-
	#2	부지경계선		9.90		검출한계 0.002f/cc미만	-
	#3	부지경계선		9.88		검출한계 0.002f/cc미만	-
	#4	부지경계선		9.91		검출한계 0.002f/cc미만	-
	#5	위생설비입구1		9.93		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#6	위생설비입구2		9.91		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#7	음압기배출구1		9.91		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#8	음압기배출구2		9.93		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#9	음압기배출구3		9.92		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#10	음압기배출구4		9.93		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#11	음압기배출구5		9.90		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#12	공시료-위생설비입구2	-	-	-	0개/100시야	-
	#13	공시료-음압기배출구1	-	-	-	0개/100시야	-

※ 검출한계(LOD) : $(120,000/(V \times N)) \times 0.005$ ※N : 계수 시야 수, V : 총 포집유량(L)
(0.002f/cc ~ 0.005f/cc)

* 위상차현미경으로는 섬유석면 및 섬유상 먼지는 길이 5 μ m이상, 직경 0.25 μ m~3 μ m길이대 직경비 3:1을 기준으로 계수하며 검출석면의 종류는 판별할 수 없음.

* 모든 측정지점은 전라남도 화순군 도곡면 고인돌1로 115 도곡중앙초등학교 공사 구간기준 및 풍향, 부지경계선 근접성과 주변 유동 인구를 고려하여 측정지점 선정함.

[illegible]

도곡중앙초 등 2교(화순고) 석면철거공사

2022년 07월 31일

#1


부지경제

부지경제

부지경제

측정위치

유생생미이구

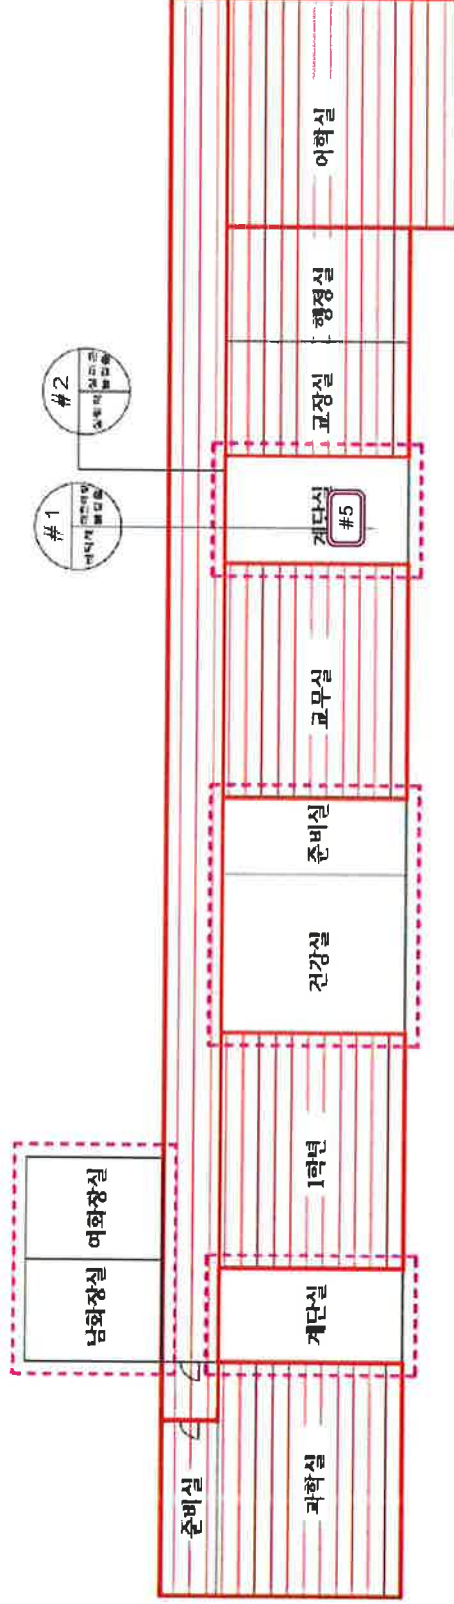[illegible]

[illegible]

[별 첨3] 석면 해체·제거 석면비산정도측정 작업일보

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부 지 경 계 선			분석결과 (기준0.01f/cc이하) [별 첨1] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별 첨2] 도식도 참조
	측정시작시간:08:05	측정종료시간:12:15	
			
	측정시작시간:08:07	측정종료시간:12:17	
			
	측정시작시간:08:10	측정종료시간:12:20	
			
	측정시작시간:08:12	측정종료시간:12:22	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
위생설비 비입구			분석결과 (기준0.01f/cc이하) [별 첨1] 참조
	측정시작시간:08:18	측정종료시간:09:18	
			
	측정시작시간:08:20	측정종료시간:09:20	
음압기 배출구			시료채취 위치 및 수량 [별 첨2] 도식도 참조
	측정시작시간:08:32	측정종료시간:09:32	
			
	측정시작시간:08:33	측정종료시간:09:33	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기배출구			분석결과 (기준0.01f/cc이하) [별 첨1] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별 첨2] 도식도 참조
	측정시작시간:08:34	측정종료시간:09:34	
			
	측정시작시간:08:35	측정종료시간:09:35	
			
	측정시작시간:08:36	측정종료시간:09:36	

석면 해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

[도곡중앙초 등 2교(화순고) 석면철거공사]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자)		사업자등록번호				
	전라남도교육감						
	주소						
		전라남도 무안군 삼향면 남악리 1457		(061-260-0114)			
석면해체·제거 사업장	건물명		위치				
	도곡중앙초등학교, 화순고등학교		전라남도 화순군 도곡면 고인들1로 115				
			전라남도 화순군 화순읍 진각로 31-9				
	연면적(㎡)		작업기간				
	1,404.30㎡, 8,962.36㎡		2022. 07. 25. ~ 2022. 08. 29.				
		석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]					
		천장재 [텍스 996.25㎡]					
측정기관	대표자		사업자등록번호				
	그린환경연구소(주) (박한재)		620-81-58149				
	주소						
	광주광역시 북구 첨단과기로208번길 43-22 와이어스파크 B동 1707호						
		측정자/분석자					
		고두형/최유리,조화정,김은숙					
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별첨1 참고						

측정 지점 위치(도식도)-별첨2 참고

석면 해체·제거 석면비산정도측정 작업일보-별첨3 참고


「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022 년 08 월 일

전라남도 화순군수

제출인
귀하

전라남도교육감



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호 서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	---	-----------

[별 첨1]. 측정결과

측정 결과	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	#1	부지경계선	에어샘플러 (15EA)	9.89	08월 01일 (08:10~ 14:32)	검출한계 0.002f/cc미만	-
	#2	부지경계선		9.89		검출한계 0.002f/cc미만	-
	#3	부지경계선		9.87		검출한계 0.002f/cc미만	-
	#4	부지경계선		9.89		검출한계 0.002f/cc미만	-
	#5	위생설비입구1		9.93		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#6	위생설비입구2		9.91		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#7	작업장주변(실외)		9.91		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#8	음압기배출구1		9.93		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#9	음압기배출구2		9.92		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#10	음압기배출구3		9.91		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#11	음압기배출구4		9.93		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#12	음압기배출구5		9.91		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#13	음압기배출구6		9.93		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#14	음압기배출구7		9.83		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#15	음압기배출구8		9.93		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#16	음압기배출구9		9.91		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#17	공시료-위생설비입구1	-	-	-	0개/100시야	-
	#18	공시료-음압기배출구9	-	-	-	0개/100시야	-

※ 검출한계(LOD) : $(120,000/(V \times N)) \times 0.005$ ※N : 계수 시야 수, V : 총 포집유량(L)
(0.002f/cc ~ 0.005f/cc)

* 위상차현미경으로는 섬유석면 및 섬유상 먼지는 길이 5 μ m이상, 직경 0.25 μ m~3 μ m길이대 직경비 3:1을 기준으로 계수하며 검출석면의 종류는 판별할 수 없음.

* 모든 측정지점은 전라남도 화순군 도곡면 고인돌1로 115 도곡중앙초등학교 공사 구간기준 및 풍향, 부지경계선 근접성과 주변 유동 인구를 고려하여 측정지점 선정함.

도곡중앙초 등 2교(화순고) 석면철거공사

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[별첨3] 석면 해체·제거 석면비산정도측정 작업일보

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부 지 경 계 선			분석결과 (기준0.01f/cc이하) [별첨1] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별첨2] 도식도 참조
	측정시작시간:08:10	측정종료시간:12:20	
			
	측정시작시간:08:12	측정종료시간:12:22	
			
	측정시작시간:08:14	측정종료시간:12:24	
			
	측정시작시간:08:16	측정종료시간:12:26	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
위생설비입구			분석결과 (기준0.01f/cc이하) [별 첨1] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별 첨2] 도식도 참조
	측정시작시간:08:20	측정종료시간:09:20	
			
	측정시작시간:08:25	측정종료시간:09:25	
작업장 주변 (실외)			
	측정시작시간:08:28	측정종료시간:10:38	
음압기 배출구			
	측정시작시간:08:33	측정종료시간:09:33	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기배출구			분석결과 (기준0.01f/cc이하) [별 첨1] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별 첨2] 도식도 참조
	측정시작시간:08:34	측정종료시간:09:34	
			
	측정시작시간:08:35	측정종료시간:09:35	
			
	측정시작시간:08:36	측정종료시간:09:36	
			
	측정시작시간:08:37	측정종료시간:09:37	


측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배출구			분석결과 (기준0.01f/cc이하) [별 첨1] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별 첨2] 도식도 참조
	측정시작시간:08:38	측정종료시간:09:38	
			
	측정시작시간:13:30	측정종료시간:14:30	
			
	측정시작시간:13:31	측정종료시간:14:31	
			
	측정시작시간:13:32	측정종료시간:14:32	

『그린-비2207-05』

석면 해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

[도곡중앙초 등 2교(화순고) 석면철거공사]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자)		사업자등록번호				
	전라남도교육감						
	주소						
		전라남도 무안군 삼향면 남악리 1457		(061-260-0114)			
석면해체 · 제거 사업장	건물명		위치				
	도곡중앙초등학교, 화순고등학교		전라남도 화순군 도곡면 고인들1로 115				
	연면적(㎡)		전라남도 화순군 화순읍 진각로 31-9				
	1,404.30㎡, 8,962.36㎡		작업기간		2022. 07. 25. ~ 2022. 08. 29.		
		석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]					
		천장재 [텍스 996.25㎡]					
측정기관	대표자		사업자등록번호				
	그린환경연구소(주) (박한재)		620-81-58149				
	주소						
	광주광역시 북구 첨단과기로208번길 43-22 와이어스파크 B동 1707호						
		측정자/분석자					
		고두형/최유리, 조화정, 김은숙					
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별첨1 참고						
측정 지점 위치(도식도)-별첨2 참고 석면 해체·제거 석면비산정도측정 작업일보-별첨3 참고							
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.							
		제출인		2022 년 08 월 일			
전라남도 화순군수		귀하		전라남도교육감 (서명 또는 인)			
							

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호 서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	---	-----------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별첨1]. 측정결과

측정 결과	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	#1	부지경계선	에어샘플러 (15EA)	9.89	08월 02일 (08:20~ 14:30)	검출한계 0.002f/cc미만	—
	#2	부지경계선		9.89		검출한계 0.002f/cc미만	—
	#3	부지경계선		9.87		검출한계 0.002f/cc미만	—
	#4	부지경계선		9.88		검출한계 0.002f/cc미만	—
	#5	위생설비입구		9.93		검출한계 0.005f/cc미만	—
	#6	작업장주변(실외)		9.90		검출한계 0.005f/cc미만	—
	#7	음압기배출구1		9.93		검출한계 0.005f/cc미만	—
	#8	음압기배출구2		9.90		검출한계 0.005f/cc미만	—
	#9	음압기배출구3		9.91		검출한계 0.005f/cc미만	—
	#10	음압기배출구4		9.92		검출한계 0.005f/cc미만	—
	#11	음압기배출구5		9.91		검출한계 0.005f/cc미만	—
	#12	음압기배출구6		9.93		검출한계 0.005f/cc미만	—
	#13	음압기배출구7		9.83		검출한계 0.005f/cc미만	—
	#14	음압기배출구8		9.93		검출한계 0.005f/cc미만	—
	#15	폐기물반출구1		9.93		검출한계 0.005f/cc미만	—
	#16	폐기물반출구2		9.83		검출한계 0.005f/cc미만	—
	#17	폐기물반출구3		9.80		검출한계 0.005f/cc미만	—
	#18	폐기물보관지점1		9.81		검출한계 0.005f/cc미만	—
	#19	폐기물보관지점2		9.82		검출한계 0.005f/cc미만	—
	#20	공시료-부지경계선	—	—	—	0개/100시야	—
	#21	공시료-위생설비입구	—	—	—	0개/100시야	—

※ 검출한계(LOD) : $(120,000/(V \times N)) \times 0.005$ ※N : 계수 시야 수, V : 총 포집유량(L)
(0.002f/cc ~ 0.005f/cc)

* 위상차현미경으로는 섬유석면 및 섬유상 먼지는 길이 5 μ m이상, 직경 0.25 μ m~3 μ m길이대 직경비 3:1을 기준으로 계수하며 검출석면의 종류는 판별할 수 없음.

* 모든 측정지점은 전라남도 화순군 도곡면 고인돌1로 115 도곡중앙초등학교 공사 구간기준 및 풍향, 부지경계선 근접성과 주변 유동 인구를 고려하여 측정지점 선정함.


도덕중양초등학교 2교(화순고) 석면철거공사

[illegible]

[별첨2]. 측정 지점 위치(도식도)

도곡중앙초 등 2교(화순고) 석면철거공사			
측정일자		2022년 08월 02일	
범례	측정지점	#1	
	부지경계	-	
	작업구역		
시료번호	측정위치		
	#5	위생설비입구1	
	#7	음압기배출구1	
	#8	음압기배출구2	
	#9	음압기배출구3	
	#10	음압기배출구4	
	#11	음압기배출구5	
	#12	음압기배출구6	
	#13	음압기배출구7	
	#14	음압기배출구8	
	#15	폐기물반출구1	

[도곡중앙초등학교 1층 평면도]

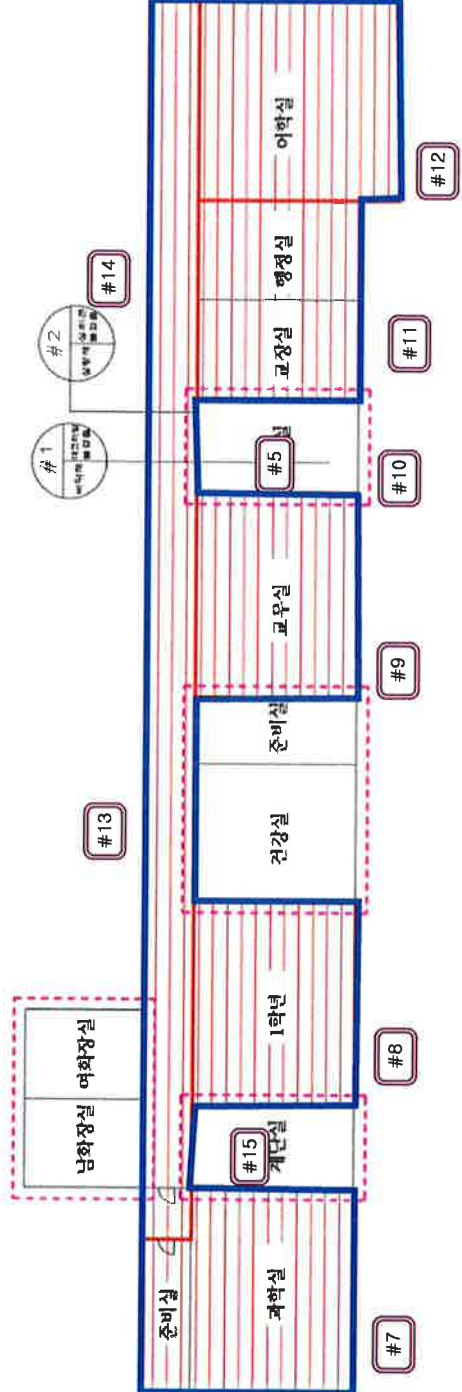

[도곡중앙초등학교 1층 평면도]

[illegible]

[별첨3] 석면 해체·제거 석면비산정도측정 작업일보

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부 지 경 계 선			분석결과 (기준0.01f/cc이하) [별첨1] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별첨2] 도식도 참조
	측정시작시간:08:20	측정종료시간:12:30	
			
	측정시작시간:08:22	측정종료시간:12:32	
			
	측정시작시간:08:24	측정종료시간:12:34	
			
	측정시작시간:08:26	측정종료시간:12:36	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
위생설비입구			분석결과 (기준0.01f/cc이하) [별 첨1] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별 첨2] 도식도 참조
	측정시작시간:08:30	측정종료시간:09:30	
작업장 주변(실외)			
	측정시작시간:08:35	측정종료시간:10:45	
음압기배출구			
	측정시작시간:08:38	측정종료시간:09:38	
			
	측정시작시간:08:39	측정종료시간:09:39	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기배출구			분석결과 (기준0.01f/cc이하) [별 첨1] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별 첨2] 도식도 참조
	측정시작시간:08:40	측정종료시간:09:40	
			
	측정시작시간:08:41	측정종료시간:09:41	
			
	측정시작시간:08:43	측정종료시간:09:43	
			
	측정시작시간:08:44	측정종료시간:09:44	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배출구			분석결과 (기준0.01f/cc이하) [별 첨1] 참조
	측정시작시간:08:46	측정종료시간:09:46	
			
	측정시작시간:08:47	측정종료시간:09:47	
폐기물 반출구			시료채취 위치 및 수량 [별 첨2] 도식도 참조
	측정시작시간:09:30	측정종료시간:10:30	
			
	측정시작시간:10:00	측정종료시간:11:00	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐 기 물 반 출 구			분석결과 (기준0.01f/cc이하) [별 첨1] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별 첨2] 도식도 참조
	측정시작시간:10:15	측정종료시간:11:15	
폐 기 물 보 관 지 점			
	측정시작시간:13:30	측정종료시간:14:30	
			
	측정시작시간:13:30	측정종료시간:14:30	

석면 해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

[도곡중앙초 등 2교(화순고) 석면철거공사]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자)	사업자등록번호					
	전라남도교육감						
주소	전라남도 무안군 삼향면 남악리 1457						
	(061-260-0114)						
석면해체·제거 사업장	건물명	위치					
	도곡중앙초등학교, 화순고등학교	전라남도 화순군 도곡면 고인들1로 115					
	연면적(㎡)	전라남도 화순군 화순읍 진각로 31-9					
	1,404.30㎡, 8,962.36㎡	작업기간					
	2022. 07. 25. ~ 2022. 08. 29.						
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)]						
	천장재 [텍스 996.25㎡]						
측정기관	대표자	사업자등록번호					
	그린환경연구소(주) (박한재)	620-81-58149					
	주 소	광주광역시 북구 첨단과기로208번길 43-22 와이어스파크 B동 1707호					
	측정자/분석자	고두형/최유리, 조화정, 김은숙					
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별첨1 참고						

측정 지점 위치(도식도)-별첨2 참고

석면 해체·제거 석면비산정도측정 작업일보-별첨3 참고

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022 년 08 월 일

전라남도 화순군수

제출인
귀하

전라남도교육감



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호 서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	---	------------

[별첨1]. 측정결과

측정 결과	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	#1	폐기물보관지점1	에어샘플러 (2EA)	9.90	08월 03일 (12:00~ 13:00)	검출한계 0.005f/cc미만	-
	#2	폐기물보관지점2		9.92		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#3	공시료-폐기물보관지점1	-	-	-	0개/100시야	-
	#4	공시료-폐기물보관지점2	-	-	-	0개/100시야	-

※ 검출한계(LOD) : $(120,000/(V \times N)) \times 0.005$ ※N : 계수 시야 수, V : 총 포집유량(L)
(0.002f/cc ~ 0.005f/cc)

* 위상차현미경으로는 섬유석면 및 섬유상 먼지는 길이 5 μ m이상, 직경 0.25 μ m~3 μ m길이대 직경비 3:1을 기준으로 계수하며 검출석면의 종류는 판별할 수 없음.

* 모든 측정지점은 전라남도 화순군 도곡면 고인돌1로 115 도곡중앙초등학교 공사 구간기준 및 풍향, 부지경계선 근접성과 주변 유동 인구를 고려하여 측정지점 선정함.

[별첨2]. 측정 지점 위치(도식도)

도곡중앙초 등 2교(화순고) 석면철거공사		
측정일자	2022년 08월 03일	
법례	측정지점	#1
	부지경계	-
	작업구역	-
	측정위치	
	시료번호	
	#1	폐기물보관지점1
	#2	폐기물보관지점2
		

[별첨3] 석면 해체·제거 석면비산정도측정 작업일보

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점			분석결과 (기준0.01f/cc이하) [별첨1] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별첨2] 도식도 참조
	측정시작시간:12:00	측정종료시간:13:00	
			
	측정시작시간:12:00	측정종료시간:13:00	

『그린-비2207-05』

석면 해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

[도곡중앙초 등 2교(화순교) 석면철거공사]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) 전라남도교육감		사업자등록번호				
	주소 전라남도 무안군 삼향면 남악리 1457		(061-260-0114)				
석면해체·제거 사업장	건물명 도곡중앙초등학교, 화순고등학교		위치 전라남도 화순군 도곡면 고인들1로 115 전라남도 화순군 화순읍 진각로 31-9				
	연면적(㎡) 1,404.30㎡, 8,962.36㎡		작업기간 2022. 07. 25. ~ 2022. 08. 29.				
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)]						
	천장재 [텍스 996.25㎡]						
측정기관	대표자 그린환경연구소(주) (박한재)		사업자등록번호 620-81-58149				
	주소 광주광역시 북구 첨단과기로208번길 43-22 와이어스파크 B동 1707호						
	측정자/분석자 고두형/최유리, 조화정, 김은숙						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별첨1 참고						

측정 지점 위치(도식도)-별첨2 참고

석면 해체·제거 석면비산정도측정 작업일보-별첨3 참고


「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022 년 08 월 일

전라남도 화순군수

제출인
귀하

전라남도교육감



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호 서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	---	-----------

[별첨1]. 측정결과

	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정 결과	#1	부지경계선	에어샘플러 (6EA)	9.91	08월 04일 (11:00~ 13:14)	검출한계 0.002f/cc미만	-
	#2	부지경계선		9.93		검출한계 0.002f/cc미만	-
	#3	부지경계선		9.88		검출한계 0.002f/cc미만	-
	#4	부지경계선		9.91		검출한계 0.002f/cc미만	-
	#5	폐기물보관지점1		9.92		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#6	폐기물보관지점2		9.89		검출한계 0.005f/cc미만	-
	#7	공시료-폐기물보관지점1	-	-	-	0개/100시야	-
	#8	공시료-폐기물보관지점2	-	-	-	0개/100시야	-

※ 검출한계(LOD) : $(120,000/(V \times N)) \times 0.005$ ※ N : 계수 시야 수, V : 총 포집유량(L)
(0.002f/cc ~ 0.005f/cc)

- * 위상차현미경으로는 섬유석면 및 섬유상 먼지는 길이 5 μ m이상, 직경 0.25 μ m~3 μ m길이대 직경비 3:1을 기준으로 계수하며 검출석면의 종류는 판별할 수 없음.
- * 모든 측정지점은 전라남도 화순군 도곡면 고인들1로 115 도곡중앙초등학교 공사 구간기준 및 풍향, 부지경계선 근접성과 주변 유동 인구를 고려하여 측정지점 선정함.
- * 금일 폐기물상차로 인한 비산정도 측정지점은 부지경계선에 한함. 측정시간 또한 폐기물상차시간에 한하여 측정 실시함.

[illegible]

[별 첨3] 석면 해체·제거 석면비산정도측정 작업일보

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지 경계 선			분석결과 (기준0.01f/cc이하) [별 첨1] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별 첨2] 도식도 참조
	측정시작시간:11:00	측정종료시간:13:10	
			
	측정시작시간:11:02	측정종료시간:13:12	
			
	측정시작시간:11:03	측정종료시간:13:13	
			
	측정시작시간:11:04	측정종료시간:13:14	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관지점			분석결과 (기준0.01f/cc이하) [별 첨1] 참조 시료채취 위치 및 수량 [별 첨2] 도식도 참조
	측정시작시간:12:00	측정종료시간:13:00	
			
	측정시작시간:12:00	측정종료시간:13:00	
